




# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 57	<b>Fecha Informe:</b> 14 - 09 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	<b>Personal Encargado:</b> MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	---------------------------	---	---	--

**Foto Bitacora:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto Bitacora 2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto Bitacora 3:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto Bitacora 4:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto Bitacora 5:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto Bitacora 6:**



[Ver imagen completa](#)

### Asunto:

se registra actividad en drenaje  
 actividad en movimiento de tierras: conformación de sub rasante  
 actividad en Obras Preliminares: seguridad vial  
 conformación de material excedente: DEM  
 actividad en planta chancadora: hoy en falla mecánica  
 el día de hoy se verifica el traslado de poste de la compañía wow

### Conclusiones:

se mejora los frentes de trabajo en tramo 2  
 pendiente de respuesta de concreto en faldones por parte de la entidad  
 pendiente la solicitud a entidad por registros fotográficos del cuaderno de obra del monito

### Recomendaciones:

después de la reunión de supervisión y residencia seles recomienda tomar acuerdos para intervenir el ovalo  
 se recomienda usar el rodillo pata de cabra en zonas arcillosas  
 se recomienda a la entidad : derecho de vía pronunciar un memoradum de liberación de este frente.

### Auditoria Fecha De Creación:

14-09-2023

### Auditoria Fecha De Edición:

15-09-2023

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

14-09-2023

### Actividades:

liberación de postes  
WOW

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

en km 0+000 ovalo se reubica poste

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

14-09-2023

1



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografía:**

14-09-2023


**Actividades:**

proceso de traslado de poste de comunicaciones

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

maniobra de traslado de poste antes y después no realizaron señalización en la zona de trabajo

**Foto1:**

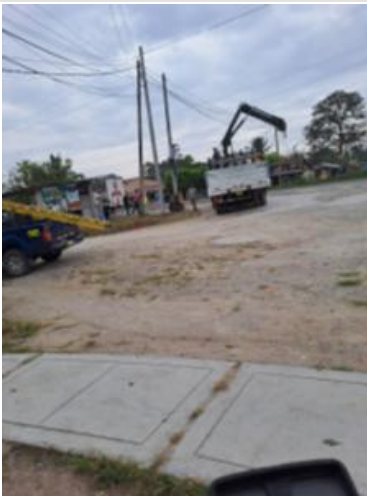

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

14-09-2023

2



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

14-09-2023

### Actividades:

DEM

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

km 15+500 se verifica la recepción de material

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

14-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

14-09-2023

### Actividades:

drenaje

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

excavación de zanja de drenaje en km 18+980 a 18+870 equipo de trabajo N°1  
se utiliza el siguiente equipo mecánico: volquete, retroexcavadora y minicargador, camión

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

14-09-2023

4



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

14-09-2023

**Actividades:**

drenaje  
obras provisionales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

segundo frente de drenaje en km 18+700 se encuentra en ejecución de la colocación de sub drenes

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

14-09-2023

5



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

14-09-2023

### Actividades:

drenaje  
obras provisionales

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

proceso de construcción de las alcantarillas 12+140 y 12+129 etapa de colocación de acero y encofrado se verifica la colocación de señales de zonificación mediante delineadores y cintas de seguridad

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

14-09-2023

6



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

14-09-2023

**Actividades:**

drenaje

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

alcantarilla 12+409 y 12+397 se está ejecutando el encofrado de losa superior en ambas alcantarillas

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

14-09-2023

7





### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

14-09-2023

**Actividades:**

visita al laboratorio de suelos de la contratista

**CDescripcion :**

se verifica la ejecución de ensayos de CBR y probetas de concreto en el cuidado bajo agua se verifica la ejecución de

8

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

14-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

14-09-2023

### Actividades:

verificación de protección en alcantarillas

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

km 0+950 excavación en seco para estructuras se ha verificado que se encuentra en proceso de deslave por acción de lluvias

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

14-09-2023

9



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

14-09-2023

### Actividades:

movimiento de tierras

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

excavación en material suelto con el nuevo maestro de obra de la contrata celso castillo km 14+070 alkm 14+120 lado derecho  
hoy chancadora en mantenimiento

10

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

14-09-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

14-09-2023

**Actividades:**

movimiento de tierras

**CDescripcion :**

19+500 a 19+550 reconfirmación de sub rasante, ya sea por saturación o por falla de superficie se vuelve a escarificar eliminar piedras grandes y compactar dicha zona.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

14-09-2023

11



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

14-09-2023

### Actividades:

movimiento de tierras

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

se verifica actividad en km 17+870 a 17+760 el, corte y colocación de material de mejoramiento  
no se verifica la utilización del rodillo pata de cabra en el suelo expuesto después del corte

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

14-09-2023

12



**Fotos:**
