



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	171 - 2023- ABAN CAY- N A C M - ESC- D O PVN- MTC	18 - 09 - 2023	NOMBRE DE LA INVERSIÓN CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

**Asunto:**

INFORME N° 171-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL LUNES 18 DE SETIEMBRE DEL 2023  
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2  
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.  
 CLIMA: PARCIALMENTE NUBLADO CON LLOVIZNAS EN SECTORES.

**Conclusiones:**

POR LA TARDE SE HIZO EL RECORRIDO PARA LA VERIFICACION DE LOS POSTES QUE AUN SE ENCUENTRAN DENTRO EL DERECHO DE VIA Y QUE ES NECESARIO SU REUBICACION POR PROCESO CONSTRUCTIVO.

ESTUVIERON PRESENTES:

ING. ELECTRICO ENRIQUE ESPINOZA - CONTRATO DE SERVICIO PARA LA REUBICACION CON PVN - MTC  
 ING. PAOLA ESPINOZA - DERECHO DE VIA - PVN  
 DR. KATY ALEGRIA - DERECHO DE VIA  
 ING. DE CONTROL DE TOPOGRAFIA DE DERECHO DE VIA.  
 ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA Y SUPERVISION.

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.  
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:  
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS  
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO  
 48 VOLQUETES DE 15 M3  
 04 CAMIONES CISTERNA DE AGUA  
 01 CARGADOR S/NEUMATICO  
 02 MOTONIVELADORAS  
 02 RODILLO VIBRATORIO  
 02 RETROEXCAVADORA  
 01 MINICARGADOR  
 01 TRACTOR D-8 S/O  
 EQUIPO SUPERVISION:  
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4  
 01 MINIVAN



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Recomendaciones:

EN EL RECORRIDO EN EL SECTOR SANTA ROSA NO SE PUDO VERIFICAR LA REUBICACION DE POSTES (CINCO EN TOTAL) YA QUE SUPERVISION INDICO QUE CON EL ADICIONAL DEL MURO DE CONTENCIÓN QUE SE ESTA REALIZANDO, SE MODIFICARA EL DISEÑO GEOMETRICO DEL TRAMO, POR LO QUE SE DEBE COORDINAR CON EL ESPECIALISTA DE TOPOGRAFIA.

EL SECTOR DEL KM 11 Y 12 (DIRECCION DE AGRICULTURA) NO VERIFICAMOS POR CUESTION DE TIEMPO, POR LO QUE SE PROGRAMARA OTRA SALIDA CON EL MISMO PERSONAL PARA CULMINAR EL RECORRIDO.

**Auditoria Fecha De Creación:**

19-09-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

20-09-2023

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

18-09-2023

**Actividades:**

DME 17

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EXTENDIDO DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-09-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De**

**Fotografia:**

18-09-2023

**Actividades:**

UBICACION: DME 14

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

CIERRE DE ACTIVIDADES Y DEL DME 14

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-09-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

18-09-2023

**Actividades:**

UBICACION: TRAMO PROGRESIVAS KM 1+003 AL KM 1+103

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA EL VACIADO DE SOLADO DE ZAPATAS

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-09-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

18-09-2023

**Actividades:**

1 020

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

18-09-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+305

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 1.0 X 1.0 M

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

ENCOFRADO Y HABILITADO DE ACERO EN MUROS Y LOSA DE FONDO

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

18-09-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+377

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

ENCOFRADO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO

6

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

18-09-2023

### Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRASIVAS KM 1+515 AL KM AL KM 1+900

MOVIMIENTO DE TIERRAS - PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

02 RODILLOS LISO VIBRATORIO  
01 MOTONIVELADORA  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

7

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

18-09-2023





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

18-09-2023

### Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS Km 11+320 AL KM 11+390

MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE

### CDescripcion

01 EXCAVADORA S/O  
22 VOLQUETES DE 15 M3  
01 RODILLO LISO VIBRATORIO

8

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

18-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

18-09-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 10+897

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 1.0 X 1.0 M

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

ENCOFRADO Y HABIATDO DE ACERO EN MUROS Y LOSA DE FONDO

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

18-09-2023

9



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

18-09-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRSIVA KM 0+240

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

DESMONTE DE VIVIENDA, DEPOSITADO EN LA VIA SIN AUTORIZACION DEL CONTRATISTA, DEBE NOTIFICAR AL PROPIETARIO PARA SU ELIMINACION.

10

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

19-09-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

18-09-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+760

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

SE TIENE OTRO DESMONTE DE DEMOLICION Y CORTE DE UNA PROPIEDAD PRIVADA DEPOSITADA EN MEDIO DE LA PLATAFORMA.

DEBE NOTIFICAR AL DUEÑO DE ESTE DESMONTE PARA QUE RETIRE A LA BREVEDAD POSIBLE.

11

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-09-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

18-09-2023

**Actividades:**


UBICACION: : PROGRESIVA KM 0+990

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

RECORRIDO CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA REUBICACION DE POSTES DENTRO EL DERECHO DE VIA A RE UBICAR.

12

**Foto1:**

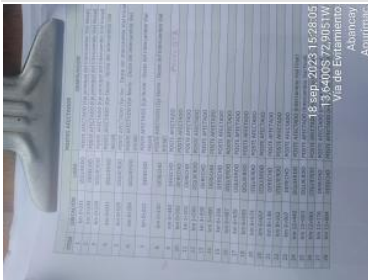

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-09-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

18-09-2023

**Actividades:**

UBICACION: : PROGRESIVA KM 1+595

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

RECORRIDO CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA REUBICACION DE POSTES DENTRO EL DERECHO DE VIA A RE UBICAR.

13

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-09-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

18-09-2023

**Actividades:**

UBICACION: : PROGRESIVA KM 9+907

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

RECORRIDO CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA REUBICACION DE POSTES DENTRO EL DERECHO DE VIA A RE UBICAR.

14

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-09-2023
