



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	216-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	10-11-2023	VIA EVITAMIENTO ABANCAY	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 216-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: NUBLADO Y LOVIZNA TODO EL DIA.

SE TUVO LA VISITA DE ING. DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA: CGR:

Jefe de Control de Comisión: Ing. Víctor Vizcarra Barriga
Comisión de Control: Ing. Guido Anchayhua Segovia.

CRTG:

Residente de Obra: Ing. Jorge Navarro Valle
Jefe de la Oficina Técnica: Ing. Oswaldo Placencia Contreras
Licenciado: Enrique de la Torre Zambrano

SUPERVISIÓN:

Jefe de Supervisión: Ing. Gerardo Saavedra Sanguinetti
Esp. Suelos y Pavimentos : Ing. Marvin Izarra Zoriano
Asistente Liberación de Predios: Ángel Sáenz Sandoval
Esp. En Relaciones Comunitarias: Rubén Palacios Delgado

DERECHO DE VIA - PVN:

Ing. Paola Espinoza Juro – Responsable Monitoreo Campo
Abogado Katty Alegría – Responsable en campo.



Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
 32 VOLQUETES DE 15 M3
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO
 04 MOTONIVELADORAS
 04 RODILLO VIBRATORIO
 03 RETROEXCAVADORA
 02 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

COMO RECOMIENDA LA CGR, EL CONTRATISTA DEBE DESOCUPAR EL CAMPAMENTO DE LEONPAMPA, PARA PROCEDER A SU DEMOLICION Y TENER MAS FRENTES DE TRABAJO.

Auditoria Fecha De Creación:

14-11-2023

Auditoria Fecha De Edición:

15-11-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
 ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

10-11-2023

Actividades:

UBICACION: DME 7

CDescripcion_____:

ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-11-2023

Actividades:

UBICACION: DME 13

CDescripcion

01 EXCAVADORA S/O
01 TRACTOR S/O D-8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-11-2023

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

10-11-2023

Actividades:

UBICACION: DME 14

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

10-11-2023

Actividades:

UBICACION: KM 1 +080

MURO DE CONTENCIÓN TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 1+003 AL KM 1+103

CDescripcion _____ :

HABILITADO DE ENCOFRADO DE PANTALLAS.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

10-11-2023

Actividades:

UBICACION DEL REPORTE KM 2+200

SUBDRENES TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 2+142 AL KM 2+327

CDescripcion _____ :

EXCAVACION DE ZANJA.
RELLENO DE MATERIAL FILTRO.
COLOCADO DE GEOTEXTIL.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

10-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+728

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 2.5 M X 2.0 M

CDescripcion _____ :

ENCOFRADO.

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-11-2023

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

10-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+900

VERIFICACION DE MURO DE CONTENCIÓN

CDescripcion _____ :

CGR - VISITA DE CONTROL.

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

10-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+260

CAMPAMENTO LEONPAMPA

CDescripcion _____ :

CGR - INDICO QUE DEBE DESOCUPAR EL CONTRATISTA PARA SU DEMOLICION.

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

10-11-2023

Actividades:

UBICACION: OFICINA DE SUPERVISION - PATIBAMBA BAJA

CDescripcion _____ :

CGR - FIRMA DE ACTA DE LA VISITA.


9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

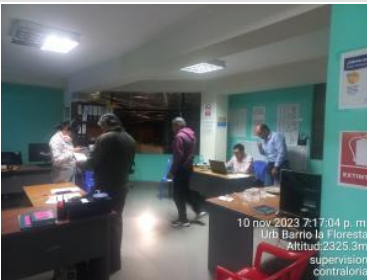

[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-11-2023
