



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Provias  
Nacional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

## INFORME N° 200 -2021-MTC/20.11.1/ERMV

- A** : **ABOG. ROLLER EDINSON ROJAS FLOREANO**  
Director de la Dirección de Derecho de Vía.
- ASUNTO** : INFORME COMPLEMENTARIO SOBRE DISPONIBILIDAD FÍSICA DEL TERRENO, PARA LA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGIÓN CALLAO.
- REFERENCIA** : a) Memorándum N° 485-2021-MTC/20.10 - (Exp. I-030637-2020/SEDCEN)  
b) Memorándum N° 2745-2021-MTC/20.11  
c) Informe N° 182-2021-MTC/20.11.1/ERMV  
d) Memorándum N° 430-2021-MTC/20.11  
e) Memorándum N° 7326-2020-MTC/20.22.4  
f) Informe N° 585-2020-MTC/20.22.4.4/ERMV
- FECHA** : Lima, 06 de abril del 2021.



Me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia para complementar información sobre la Disponibilidad de terreno para la Construcción del Puente Santa Rosa, Accesos, Rotonda y Paso a Desnivel, Región Callao, según pedido expreso por parte de la Dirección de Obras de Puentes.

El presente informe, así como el Informe referenciado en literal c), se basan en la actualización del Informe N° 585-2020-MTC/20.22.4.4/ERMV, remitido a la Dirección de Obras de Puentes en su oportunidad, dicho ello, paso a informar lo siguiente:

### 1. ANTECEDENTES:

- 1.1 PROVIAS NACIONAL es un Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creado mediante Decreto Supremo N° 033-2002-MTC del 12.07.2002, encargado de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes.
- 1.2 Mediante el Memorándum N° 0157-2020-MTC/20.22.1, de fecha 22.01.2020, la Subdirección de Estudios entrega la información complementaria de interferencias de redes de agua, desagüe, canales de riego, tuberías de gas y otros a la Subdirección de Derecho de Vía, elaborados por el consultor URCI Consultores S.L. Sucursal del Perú.
- 1.3 Para proceder con la liberación de interferencias, con fecha 12.03.2020, se emitió la Orden de Servicio N° 0000659-2020 para la ejecución del Servicio de: Elaboración de Expediente Técnico Referencial para la reubicación de redes de agua potable y alcantarillado afectados por el Derecho de Vía para la ejecución de la obra: Construcción del Puente Santa Rosa, Accesos, Rotonda y Paso a Desnivel, Región Callao”.
- 1.4 Mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15.03.2020, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por un plazo de quince (15) días calendario, y dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote de COVID-19, suspendiendo las actividades de liberación predial y de interferencias.
- 1.5 Mediante Decreto Supremo 094-2020- PCM de fecha 23.05.2020, se declaró prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N°

Ing. Elena Y. Villalobos Carranza  
Especialista Técnico - PACRI



BICENTENARIO  
PERÚ 2021

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú  
T. (511) 615-7800

[www.pvn.gob.pe](http://www.pvn.gob.pe)



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Provias Nacional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM y N° 083-2020-PCM, a partir del lunes 25 de mayo de 2020 hasta el martes 30 de junio de 2020.

- 1.6 Mediante Resolución Directoral N° 1472-2020-MTC/20, se aprobó administrativamente el “Estudio definitivo del proyecto: “Construcción del Puente Santa Rosa, Accesos, Rotonda y Paso a Desnivel, Región Callao” presentado por la empresa URCI Consultores S.L. Sucursal del Perú.
- 1.7 Mediante Carta N° 001-2020-OS659-EACL, de fecha 30.07.2020 (Exp. E- 062249-2020/SEDCEN), EL LOCADOR presenta su Expediente Técnico Referencial para la reubicación de redes de agua potable y alcantarillado afectados por el Derecho de Vía para la ejecución de la obra: CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGION CALLAO”, después de haberse reanudado la Orden de Servicio N° 0000659-2020.
- 1.8 Con fecha 10.09.2020, se suscribe el CLS N° 132-2020-MTC/20.22.4, entre la Subdirección de Derecho de Vía, a través del Abg. Roller Edinson Rojas Floreano, Subdirector de Derecho de Vía – Provías Nacional (LA ENTIDAD) y el Ing. Luis Orlando Merino Caballero (EL LOCADOR), para la ejecución del “Servicio para la adquisición de 13 inmuebles afectados por el Derecho de Vía de la Obra: Construcción del Puente Santa Rosa, Accesos, Rotonda y Paso a Desnivel, Región Callao, Región Callao – Fases I, II, III y IV”.
- 1.9 Mediante Memorándum N° 430-2021-MTC/20.10 de fecha 23.03.2021, vía correo electrónico la Subdirección de Obras de Puentes, solicitó a la Dirección de Derecho de Vía, un informe donde se informe la situación actual sobre la disponibilidad física del terreno donde se ejecutará la obra indicada en el asunto y de las acciones que realiza el despacho de la DDV en el tema que les ocupa, precisando fechas probables.
- 1.10 Mediante Memorándum N° 2745-2021-MTC/20.11 de fecha 30.03.2021, la Dirección de Derecho de Vía, remitió Informe N° 182-2021-MTC/20.11.1/ERMV sobre la situación actual de la disponibilidad física del terreno donde se ejecutará la obra indicada en el asunto y de las acciones que realiza el despacho de la DDV en el tema que les ocupa, precisando fechas probables.
- 1.11 Mediante Memorándum N° 485-2021-MTC/20.10 de fecha 05.04.2021, vía correo electrónico la Dirección de Obras de Puentes, solicitó a la Dirección de Derecho de Vía, un nuevo informe donde se detalle con mayor precisión la situación actual sobre la disponibilidad física del terreno donde se ejecutará la obra indicada en el asunto y de las acciones que realiza el despacho de la DDV en el tema que les ocupa, precisando fechas probables, basándose en el Informe N° 585-2020-MTC/20.22.4/ERMV, remitido mediante Memorándum N° 7326-2020-MTC/20.22.4, oportunamente por el despacho de la DDV.



## 2. ESTADO SITUACIONAL DE LIBERACIÓN DE PREDIOS E INTERFERENCIAS

### 2.1 ESTADO SITUACIONAL DE LIBERACION DE PREDIOS

#### 2.1.1 Liberación de Predios con Actas de Compromiso de Trato de Directo.

De los trabajos realizados a la fecha se ha identificado un total de 20 inmuebles afectados por el derecho de vía del precitado proyecto Vial, donde se encuentra pendiente la liberación, adquisición e inscripción a nombre de la Entidad conforme a lo establecido en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, cuyo estado situacional es la siguiente, siendo el estado actual el siguiente:

N°	CODIGO	CONDICION LEGAL	ESTADO
1	SR-EL01-CA-01	Propietario	En trámite de Certificación Presupuestal
2	SR-EL01-CA-02	Propietario	En trámite de Certificación Presupuestal
3	SR-EL01-CA-02-1	Posesionario	En trámite de Certificación Presupuestal

Ing. Elena Y. Villalobos Carranza  
Especialista Técnico - PACRI



BICENTENARIO  
PERÚ 2021

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú  
T. (511) 615-7800

[www.pvn.gob.pe](http://www.pvn.gob.pe)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y ComunicacionesViceministerio  
de TransportesProvias  
Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

N°	CODIGO	CONDICION LEGAL	ESTADO
4	SR-EL01-CA-03	Propietario	En trámite de Certificación Presupuestal
5	SR-EL01-CA-03-1	Posesionario	En trámite de Certificación Presupuestal
6	SR-EL01-CA-04	Propietario	En trámite de Certificación Presupuestal
7	SR-EL01-CA-05	Posesionario	En trámite de Certificación Presupuestal
8	SR-EL02-CA-06	Propietario	En trámite de Certificación Presupuestal
9	SR-EL02-CA-06-1	Posesionario	En trámite de Certificación Presupuestal
10	SR-EL02-CA-06-2	Posesionario	En trámite de Certificación Presupuestal
11	SR-EL02-CA-06-A	Posesionario	En trámite de Certificación Presupuestal
12	SR-EL02-CA-07	Propietario	En trámite de Certificación Presupuestal
13	SR-EL02-CA-07-1	Posesionario	En trámite de Certificación Presupuestal
14	SR-EL02-CA-08	Propietario	En trámite de Certificación Presupuestal
15	SR-EL02-CA-08-1	Posesionario	En trámite de Certificación Presupuestal
16	SR-ENR-CA-14	Propietario	Transferencia Interestatal
17	SR-ENR-CA-14-1	Propietario	Transferencia Interestatal
18	SR-E02-CA-15	Propietario	Transferencia Interestatal
19	SR-E02-CA-17	Propietario	Transferencia Interestatal
20	SR-E02-CA-23	Posesionario	Transferencia Interestatal




## 2.2 INTERFERENCIAS - LIBERACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS

Luego de las coordinaciones, evaluación y revisión de los documentos correspondiente a la reubicación de las redes eléctricas que interfieren con la "Construcción del Puente Santa Rosa, Accesos, Rotonda y Pasos a Desnivel, Región Callao" Distrito y Provincia del Callao, Departamento de Lima, se informa que se ha otorgado la CONFORMIDAD al presupuesto remitido por la Empresa Prestadora del Servicio Público, el cual se detalla, informando que actualmente la gestión del Convenio, se encuentra en proceso de firmas de los representantes.

- Presupuesto N° TP 174299-2020, cuyo monto total asciende a la suma de S/ 4 506 014.40 (Cuatro millones quinientos seis mil catorce con 40/100 soles), incluido IGV.
- Plazo por la ejecución de los trabajos de reubicación de Redes de Distribución Primaria, Redes de Distribución Secundaria, Alumbrado Público 1ra y 2da Etapa y Subestación de Distribución, tiene una duración de doce (12) meses.

ITEM	META FÍSICA	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA
1	PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO DE ENEL	OCTUBRE 2020
2	REVISIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESUPUESTO	ENERO 2021
3	CERTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CONVENIO	MARZO 2021
4	EJECUCIÓN DEL CONVENIO Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA ELÉCTRICA	ABRIL 2022

  
Ing. Elena Y. Villalobos Carranza  
Especialista Técnico - PACRI

BICENTENARIO  
PERÚ 2021

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú  
T. (511) 615-7800

[www.pvn.gob.pe](http://www.pvn.gob.pe)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y ComunicacionesViceministerio  
de TransportesProvias  
Nacional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

### 2.3 INTERFERENCIAS - LIBERACIÓN DE REDES DE FIBRA ÓPTICA

De acuerdo al EDI aprobado, existen diferentes interferencias de redes de fibra óptica, con diferentes compañías, tales como: Claro, Movistar, Entel y Azteca, respecto al estado actual, se informa lo siguiente.

- Claro: Se encuentra en trámite de gestión de conformidad del proyecto de Convenio.
- Entel: Se está a la espera de la aprobación de la Oficina de Administración de su presupuesto para su posterior pago, debido a que el monto es menor a una UIT.
- Movistar: Convenio suscrito, en proceso de ejecución.
- Azteca: Provias Nacional ha realizado las observaciones al presupuesto presentado por la Empresa Prestadora del Servicio Público.

ITEM	META FÍSICA	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA
1	PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO DE FO	OCTUBRE 2020
2	REVISIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESUPUESTO	ABRIL 2021
3	CERTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CONVENIO	ABRIL 2021
4	PRIMER PAGO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	MAYO 2021
5	EJECUCIÓN DEL CONVENIO Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA ELÉCTRICA	OCTUBRE 2021




### 2.4 INTERFERENCIAS – RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

De acuerdo al EDI aprobado, existen interferencias sanitarias, de agua potable y alcantarillado. Para ello, se ha ejecutado la Orden de Servicio N° 0659-2020, del: **“Servicio de elaboración de Expediente Técnico Referencial para la reubicación de redes de agua potable y alcantarillado afectados por el Derecho de Vía para la ejecución de la obra: Construcción del Puente Santa Rosa, Accesos, Rotonda y Paso a Densivel, Región Callao, Región Callao”**. Actualmente se cuenta con el Expediente Técnico Referencial, aprobado con Resolución Directoral N° 2429-2020-MTC/20 de fecha 25.11.2020, el mismo que cuenta con certificación presupuestal respectiva. Así mismo, se coordinó con Sedapal, a fin de que, revise dicho expediente técnico referencial, a la fecha se cuenta con la conformidad del Expediente Técnico Referencial, y se están realizando las gestiones para la convocatoria e inicio de su ejecución.

ITEM	META FÍSICA	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA
1	ELABORACIÓN DE EXP. TEC. REFERENCIAL	AGOSTO 2020
2	COORDINACIÓN CON SEDAPAL, RESPECTO A LOS PLANTEAMIENTOS DE REUBICACIÓN.	SEPTIEMBRE 2020
3	APROBACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE LIBERACIÓN.	NOVIEMBRE 2020
4	CONVOCATORIA DE LA OBRA (INC. ELAB. DE EXP. DEFINITIVO)	ABRIL 2021
5	- ELABORACIÓN DE EXP. DEFINITIVO	MAYO 2021
6	- EJECUCIÓN DE OBRA	OCTUBRE 2021
	RECEPCION DE OBRA SIN OBSERVACIONES	ABRIL 2022

### 3. CRONOGRAMA ACTUALIZADO PARA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS

En la Esquema adjunto se puede visualizar, las acciones realizadas por la Dirección de Derecho de Vía en cumplimiento del requerimiento de Liberación de Interferencias para la ejecución de la obra: “Construcción del Puente Santa Rosa, Accesos, Rotonda y Paso a Densivel, Región Callao”.

  
Ing. Elena Y. Villalobos Carranza  
Especialista Técnico - PACRI

BICENTENARIO  
PERÚ 2021

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú  
T. (511) 615-7800

[www.pvn.gob.pe](http://www.pvn.gob.pe)



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Provias Nacional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

**CRONOGRAMA DE LIBERACIÓN DE PREDIOS E INTERFERENCIAS  
CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS**

ITEM	TIPO DE INTERFERENCIAS	DESCRIPCION DE LA INTERFERENCIA	OBSERVACION	FECHA PROGRAMADA DE LIBERACION												FECHA PROGRAMADA DE LIBERACION
				2021												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	PREDIOS	15 EDIFICACIONES AFECTADAS MUNICIPIO DE TACASIONES S/ 3'802,192.54	SOLICITUD DE CERTIFICACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	OCTUBRE 2021
2	INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO VALOR REFERENCIAL S/ 11.88 MILLONES	REDES DE AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO POZO SUBTERRANEO DE AGUA POTABLE	REUBICACION - CONCURSO OFERTA INVITACION DE POSTORES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ABRIL 2022
3	INTERFERENCIA DE GAS - CALIDA VALOR REFERENCIAL S/ 1'132,948.10		PROCESO DE CONVENIO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	OCTUBRE 2021
4	INTERFERENCIA DE REDES DE ELECTRICAS ENEL VALOR REFERENCIAL S/ 4.5 MILLONES	POSTES Y REDES AEREAS Y SUBTERRANEAS ILUMINACION ORNAMENTAL EN EL PUENTE	PROCESO DE CONVENIO (El tramite se encuentra en Administracion para emision de opinion)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ABRIL 2022
5	INTERFERENCIA REDES DE TELEFONIA MOVISTAR VALOR REFERENCIAL S/ 46,885.33	CANALIZACION SUBTERRANEA DE FIBRA OPTICA	PROCESO DE CONVENIO (El tramite se encuentra en OAJ)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	OCTUBRE 2021
6	INTERFERENCIA REDES DE TELEFONIA - CLARO VALOR REFERENCIAL S/ 379,443.20	POSTES DE TELEFONIA Y LINEA AEREA	PROCESO DE CONVENIO (El tramite se encuentra CLARO para conformidad previo a continuar el tramite en OAJ-PVN)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	OCTUBRE 2021
7	INTERFERENCIA REDES DE TELEFONIA - ENTEL VALOR REFERENCIAL S/ 356,777.01	POSTES Y LINEA AEREA DE FIBRA OPTICA	PROCESO DE CONVENIO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	OCTUBRE 2021
8	INTERFERENCIA REDES DE TELEFONIA - AZTECA COMUNICACIONES PERU SAC VALOR REFERENCIAL S/ 85,570.46	LINEA SUBTERRANEA DE RED DORSAL DE FIBRA OPTICA	PROCESO DE CONVENIO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	OCTUBRE 2021

\* El presente Cronograma fue elaborado en función a la Programación de Obra: Construcción del Puente Santa Rosa, Accesos, Rotonda y Paso a Desnivel, Región Callao, ubicado en los folios 00143-00146, del Informe N° 03 - Informe Final, del Estudio definitivo del proyecto en mención, aprobado Mediante Resolución Directoral N° 1472-2020-MTC/20, de fecha 07.09.2020

Fuente: Dirección de Derecho de Vía

En resumen, se indica las siguientes fechas probables como plazo máximo de entrega de la Liberación de Predios e Interferencias:

ITEM	INTERFERENCIA	FECHA PROGRAMADA DE LIBERACION
1	LIBERACION DE PREDIOS	OCTUBRE 2021
2	INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO	ABRIL 2022
3	INTERFERENCIA DE GAS - CALIDA	OCTUBRE 2021
4	INTERFERENCIA DE REDES DE ELECTRICAS - ENEL	ABRIL 2022
5	INTERFERENCIA REDES DE TELEFONIA - MOVISTAR	OCTUBRE 2021
6	INTERFERENCIA REDES DE TELEFONIA - CLARO	OCTUBRE 2021
7	INTERFERENCIA REDES DE TELEFONIA - ENTEL	OCTUBRE 2021
8	INTERFERENCIA REDES DE TELEFONIA - AZTECA COMUNICACIONES PERU SAC	OCTUBRE 2021

Fuente: Dirección de Derecho de Vía

#### 4. COMPARATIVO ENTRE CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA VS. LIBERACION DE INTERFERENCIAS

- 4.1. De acuerdo a la Programación de Obra: Construcción del Puente Santa Rosa, Accesos, Rotonda y Paso a Desnivel, Región Callao, Región Callao, aprobado Mediante Resolución Directoral N° 1472-2020-MTC/20, de fecha 07.09.2020; así mismo, en función a la Programación para la liberación de interferencias y adquisiciones prediales, se han superpuesto las actividades de ambos cronogramas de la siguiente manera:

  
Ing. Elena Y. Villalobos Carranza  
Especialista Técnico - PACRI



BICENTENARIO PERU 2021

Jirón Zorritos 1203 - Lima - Perú

T. (511) 615-7800

[www.pvn.gob.pe](http://www.pvn.gob.pe)




PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes


Provias Nacional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

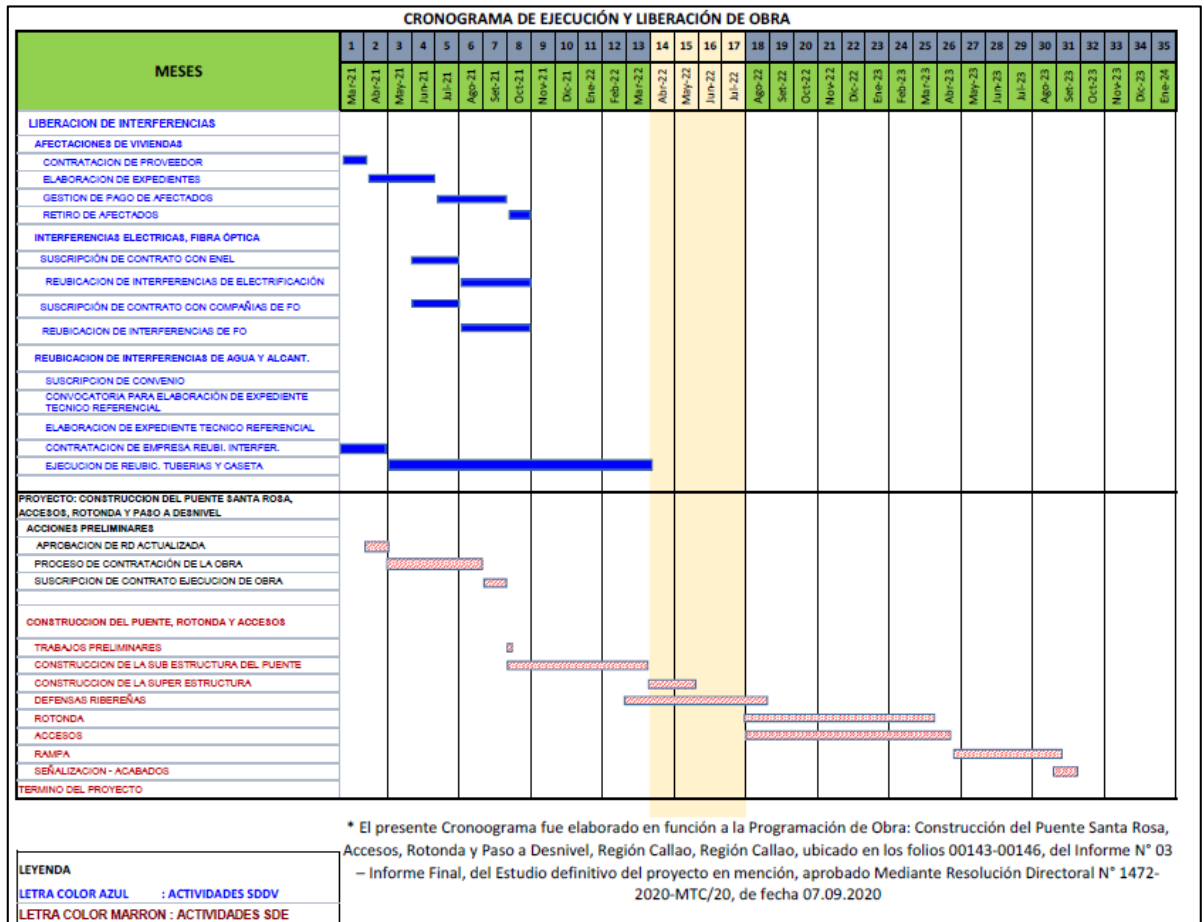

Fuente: Dirección de Derecho de Vía

- 4.2. Como se puede apreciar el cronograma anterior, asumiendo que el inicio de obra sería para octubre del presente año, 2021, la liberación de predios que tiene como fecha máxima de liberación en octubre del 2021, no lo afectaría, debido a que, la obra iniciaría con la construcción del Puente (subestructura y superestructura), lo cual, como se puede apreciar en la imagen inferior, los predios afectados se encuentran fuera (al Sur) y alejado de la construcción del Puente (al Norte). En ese sentido, teniendo programado la ejecución de la rotonda y accesos para el mes de agosto del 2022, ya no existiría interferencias prediales hasta esa fecha.

  
Ing. Elena Y. Villalobos Carranza  
Especialista Técnico - PACRI



BICENTENARIO PERU 2021

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú  
T. (511) 615-7800  
[www.pvn.gob.pe](http://www.pvn.gob.pe)




PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Provias Nacional


“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

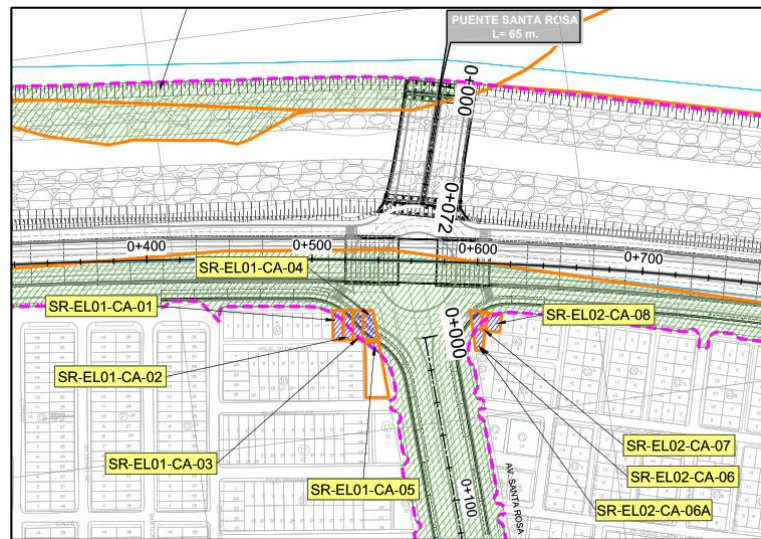

Ubicación del Puente Santa Rosa respecto a los predios (cada cual con su código)



- 4.3. A sí mismo, de acuerdo al cronograma y a la ubicación de las interferencias, la liberación de interferencias eléctricas y de Fibra Óptica que tiene como fecha máxima de liberación en octubre del 2021, no afectarían la Programación de la Obra, debido también a que, el Puente (subestructura y superestructura) y las líneas Eléctricas y de FO no se encuentran superpuestas. En ese sentido, teniendo programado la ejecución de la rotonda y accesos para el mes de agosto del 2022, ya no existiría interferencias Eléctricas ni de Fibra Óptica hasta esa fecha.
- 4.4. Del mismo modo, de acuerdo al cronograma y a la ubicación de las interferencias de Agua Potable y Desagüe, que tiene como fecha máxima de liberación en abril del 2022, no afectarían la Programación de la Obra, debido también a que, el Puente (subestructura y superestructura) y las redes de agua y desagüe no se encuentran superpuestas. Así mismo, Hasta que se inicie la ejecución de partidas de la rotonda y accesos (agosto 2022), ya se habría ejecutado la liberación de la interferencia de redes de Agua Potable y Alcantarillado existentes.

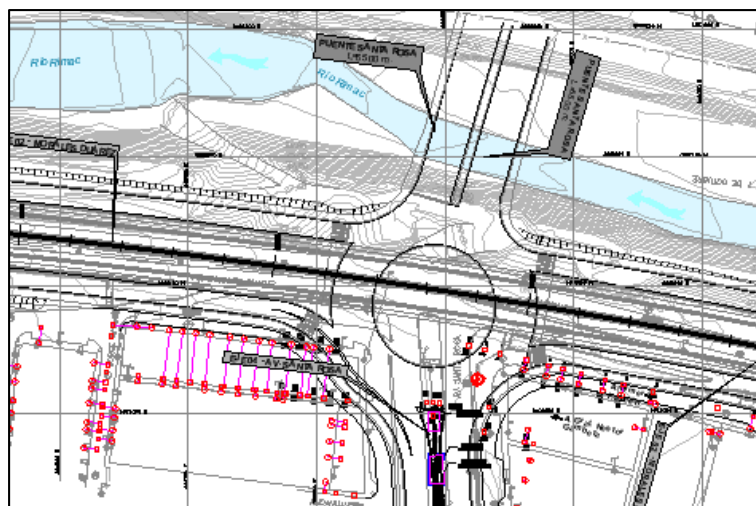

Ubicación del Puente Santa Rosa respecto a las Interferencias de Agua Potable (Color rojo)

Ing. Elena Y. Villalobos Carranza  
Especialista Técnico - PACRI



BICENTENARIO PERÚ 2021

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú

T. (511) 615-7800

[www.pvn.gov.pe](http://www.pvn.gov.pe)




PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Provias Nacional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

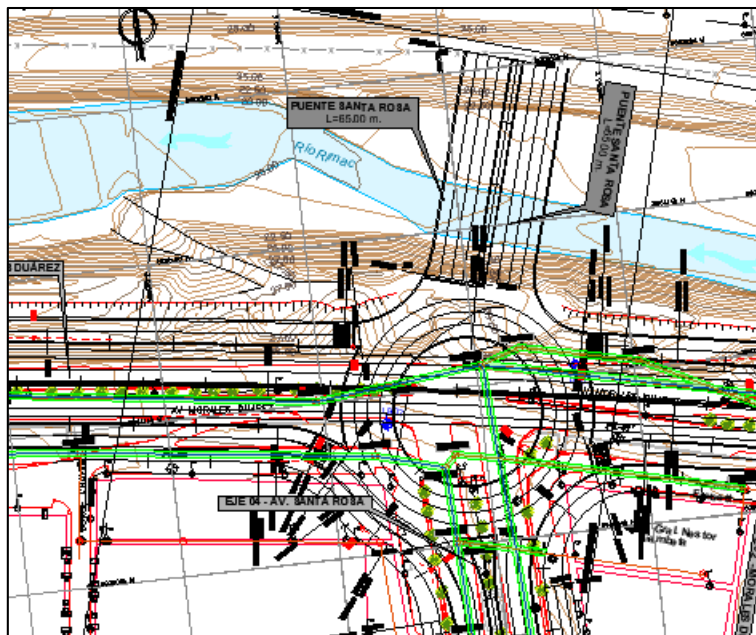

Ubicación de Puente Santa Rosa, respecto a las Interferencias de Desagüe (Color verde)

4.5. Finalmente, como se ha podido apreciar en los numerales anteriores, en concordancia con la Programación de la Obra, se ejecutarán las actividades de liberación, de tal manera que se tenga frente de obra libre de acuerdo a lo programado.

### 5. CONCLUSIONES:

De acuerdo al análisis realizado, se concluye lo siguiente:

- 5.1. Se vienen desarrollando las actividades de adquisición y expropiación, en el marco de lo establecido en el TUO del Decreto Legislativo N° 1192, teniendo programado la liberación, como fecha límite el mes de octubre del 2021.
- 5.2. De acuerdo a la Programación de Obra: Construcción del Puente Santa Rosa, Accesos, Rotonda y Paso a Dnivel, Región Callao, Región Callao, aprobado mediante Resolución Directoral N° 1472-2020-MTC/20, de fecha 07.09.2020, se iniciará ejecutando las partidas del Puente - Subestructura (OCTUBRE 2021 – MAYO 2022) y posteriormente las partidas de Rotonda y Acceso (AGOSTO 2022 – ABRIL 2023). Siendo que, los predios y las interferencias eléctrica, de fibra óptica y sanitaria no se encuentran superpuestas con el Puente, sino con la Rotonda y Acceso, se pueden ejecutar con normalidad tanto partidas de la obra como la liberación. Es así que, al inicio de la ejecución de las partidas de Rotonda y Accesos (AGOSTO 2022), ya se habría concluido con las actividades de las interferencias más duraderas (Agua y Desagüe – ABRIL 2022).
- 5.3. Con lo mencionado anteriormente, y con los datos remitidos por cada empresa prestadora de servicios y los convenios suscritos hasta la fecha, se prevé la liberación de interferencias tal y como se muestra en el siguiente cuadro, el mismo que se encuentra en el desarrollo del presente informe y detallado en el cronograma adjunto.

ITEM	INTERFERENCIA	FECHA PROGRAMADA DE LIBERACION
1	LIBERACION DE PREDIOS	OCTUBRE 2021
2	INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO	ABRIL 2022
3	INTERFERENCIA DE GAS - CALIDA	OCTUBRE 2021
4	INTERFERENCIA DE REDES DE ELECTRICAS - ENEL	ABRIL 2022
5	INTERFERENCIA REDES DE TELEFONIA - MOVISTAR	OCTUBRE 2021
6	INTERFERENCIA REDES DE TELEFONIA - CLARO	OCTUBRE 2021

Ing. Elena Y. Villalobos Carranza  
Especialista Técnico - PACRI



BICENTENARIO PERÚ 2021

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú

T. (511) 615-7800

[www.pvn.gob.pe](http://www.pvn.gob.pe)





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Provias Nacional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

7	INTERFERENCIA REDES DE TELEFONIA - ENTEL	OCTUBRE 2021
8	INTERFERENCIA REDES DE TELEFONIA - AZTECA COMUNICACIONES PERU SAC	OCTUBRE 2021

Fuente: Dirección de Derecho de Vía

- 5.4. Es necesario hacer mención que, la liberación de interferencias será de manera progresiva y coordinada, a fin de poder abrir frente de obra para la construcción de la obra: Construcción del Puente Santa Rosa, Accesos, Rotonda y Paso a Desnivel, Región Callao, Región Callao.

Es todo lo que informo a usted para los fines del caso.

Atentamente,



Ing. Erik Ronald Malqui Vilca  
Administrador de Proyectos – Pacri.

CONFORMIDAD

ING. ERIK RONALD MALQUI VILCA  
OFICINA DE GESTIÓN DE LIBERACIÓN DE PREDIOS E INTERFERENCIAS (H)  
DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA  
PROVIAS NACIONAL - MTC

Ing. Elena Y. Villalobos Carranza  
Especialista Técnico - PACRI

  
Ing. Elena Y. Villalobos Carranza  
Especialista Técnico - PACRI

BICENTENARIO  
PERÚ 2021

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú  
T. (511) 615-7800

[www.pvn.gob.pe](http://www.pvn.gob.pe)
