BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	017-2021	12-07-2021	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10, TRAMO SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:

Asunto:

Reporte diario Santiago de Chuco - Mollepata

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:
El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 255 DEL Contratista (30/06/2021)
ASIENTO N°255: DEL CONTRATISTA
ASUNTO: CESE DE CAUASAL AMPLIACIÓN DE PLAZO POR LLUVIA Nª 05.

Comunicamos a la supervisión el cese de la lluvia en el ámbito de la Obra, esta tarde verificándose que se puede utilizar el DME Nº 15 Km 29+800, por lo que dejamos constancia del cese de causal de la ampliación de plazo por lluvias. En tal sentido de acuerdo con lo estipulado en los art. 191 y 198 de RICE presentaremos nuestra solicitud de ampliación de plazo.
Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO
•A la fecha existen 3 solicitudes de ampliaciones de plazo por parte del contratista:
•Solicitud de ampliación de plazo 01: Referente al retraso por falta de DMEs a causa de un deficiente expediente técnico. DENEGADA POR LA SUPERVISIÓN.
•Solicitud de ampliación de plazo 02: contiene la misma causal que la solicitud de ampliación Nº 01, referente al retraso por falta de DMEs a causa de un deficiente expediente técnico. El día 02-07-2021 la SUPERVISIÓN respondió DENEGANDO LA SOLICITUD.
•Solicitud de ampliación de plazo 03: Referente al retraso ocasionado por el adicional de obra Nº 02, El día 02-07-2021 la SUPERVISIÓN respondió APROBANDO PARCIALMENTE LA SOLICITUD, admitiendo a trámite solo 3 días de los 33 solicitados.

2)ADICIONALES DE OBRA
•Hasta la fecha se tiene aprobado 01 adicional de obra
•Adicional de obra N.º 02, referente incorporación de nuevos DMEs, obras complementarias en DMEs nuevos y del proyecto, así como los transportes de materiales excedentes en nuevos DMEs.
•El día 07-07-2021 el contratista presento la prestación adicional Nº03 a la supervisión, referente a la incorporación al proyecto de 4 nuevos DMEs,

4)DEDUCTIVOS
•Existe 1 deductivo Vinculante, que deriva del adicional números 02.
•Deductivo vinculante n°02, por reducción y eliminación de DMEs, así como los transportes de materiales excedentes.
•El contratista presento el día 07-07-2021 deductivo vinculante Nº 03 que deriva del adicional Nº03 a la supervisión, desestimando 4 DMEs.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
•Hasta la fecha los botaderos desestimados del proyecto mediante deductivo vinculante N.º 02 son: DME Nº02, DME Nº03, DME Nº04 y DME Nº05. Asimismo mediante adicional N.º 02 se han incluido 3 nuevos botaderos: DME Nº13, DME Nº14 y DME Nº15.
•Mediante adicional Nº 03 presentado por el contratista, se plantea desestimar 4 DMEs e incorporar 4 nuevos DMEs.
•Con respecto al control de polvo en el proyecto, el contratista viene regando a un ritmo bajo la zona de la calzada con cisterna de agua.

6)MANTENIMIENTO VIAL
•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME
•Se realiza mantenimiento frente a derrumbes ocurridos en la vía.

8)PACRI
•Pacri informa que las interferencias registradas hasta la fecha a lo largo del tramo están resueltas en un 90%. Asimismo, entre las progresivas 0+000 a la 16+500 quedan pendientes la demolición de 2 viviendas de material noble que se llevara a cabo la siguiente semana. Con respecto al retiro de postes, la mayoría de estos que faltan retirar son de la empresa Bittel, quienes viene aplazando las actividades de reubicación alegando falta de fibra óptica.
•De la progresiva 17+000 a la 24+000 aproximadamente, se evidencia gran presencia de arboles por deforestar. La contratista argumenta no poder proceder con la deforestación de los arboles por la negativa de los antiguas propietarios y actuales posesionarios, quienes en su mayoría ya se les ha realizado el pago respectivo, sin embargo, se niegan a dejar proceder con los trabajos y

solicitan incentivos económicos adicionales. Ante la situación El área de Pacri y el contratista plantearon como alternativa de solución más pronta, poner a disposición de algunos pobladores de la zona los arboles con la condición de que éstos sean removidos a la brevedad de las áreas adquiridas por la entidad para el proyecto. Esta medida se ésta planteando hasta la progresiva 60+000 aproximadamente.
•El área de Pacri continúa con el levantamiento de datos de nuevas afectaciones de la progresiva 30+000 a la 60+000.

OTRAS INCIDENCIAS
•Se han incrementado los frentes de trabajo de las partidas de movimiento de tierra.

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:
12-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:
13-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
12-07-2021

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
PROGRESIVA 24+310

CDescripcion_____:
Equipos
1 excavadora sobre orugas
10 volquetes
Cuadrilla
1 Capataz
2 Ayudante vigía

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-07-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
12-07-2021

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
PROGRESIVA 24+690

CDescripcion_____:
Equipos
1 excavadora sobre orugas
5 volquetes
Cuadrilla
1 Capataz
2 Ayudante vigía

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-07-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
12-07-2021

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
PROGRESIVA 14+700

CDescripcion_____:
Equipos
1 excavadora sobre orugas
4 volquetes
Cuadrilla
1 Capataz
2 Ayudante vigía

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-07-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
12-07-2021

Actividades:
500. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
PROGRESIVA 14+502 LADO IZQUIERDO

CDescripcion_____:
Equipos
2 Vibro compactadora
Cuadrilla
1 Operario
3 Ayudantes
Personal de contratista y supervisión realizan pruebas de densidad

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-07-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
12-07-2021

Actividades:
500. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
PROGRESIVA 14+169 LADO IZQUIERDO

CDescripcion_____:
Equipos
2 Vibro compactadora
Cuadrilla
1 Operario
3 Ayudantes

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-07-2021

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
12-07-2021

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
PROGRESIVA 12+600

CDescripcion_____:
Equipos
1 excavadora sobre orugas
6 volquetes
Cuadrilla
1 Capataz
2 Ayudante vigía

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-07-2021

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
12-07-2021

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
PROGRESIVA 3+050 a 3+270

CDescripcion_____:
Equipos
3 excavadora sobre orugas
12 volquetes
Cuadrilla
1 Capataz
2 Operarios
2 Ayudante vigía

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-07-2021

8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
Leve

Fecha De Fotografia:
12-07-2021

Actividades:
Revisión de laboratorio Equipo de Supervisión

CDescripcion_____:
Se realizo la verificación de equipos de laboratorio del equipo de supervisión.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-07-2021

9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
Leve

Fecha De Fotografia:
12-07-2021

Actividades:
Revisión de laboratorio Equipo de Supervisión

CDescripcion_____:
Se realizo la verificación de equipos de laboratorio del equipo de supervisión.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-07-2021

10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
Leve

Fecha De Fotografia:
12-07-2021

Actividades:
Revisión de laboratorio de equipo de supervisión

CDescripcion_____:
Se realizo la verificación de equipos de laboratorio del equipo de supervisión.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-07-2021

11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
Leve

Fecha De Fotografia:
12-07-2021

Actividades:
Revisión de laboratorio de equipo de supervisión

CDescripcion_____:
Se realizo la verificación de equipos de laboratorio del equipo de supervisión.

Foto1:

Foto2:
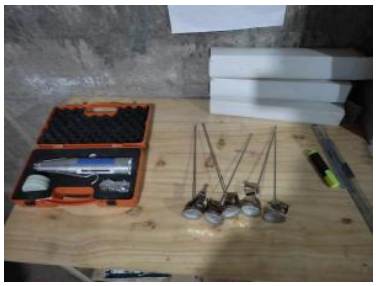

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-07-2021
