



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

TIPO DE ESTUDIO:

ESTUDIO DEFINITIVO DE  
INGENIERÍA

RED VIAL NACIONAL

## Informe Nº 3 - Informe Final

RUTA:

PE-3SJ

TÍTULO COMPLEMENTARIO

Estudio Definitivo del Proyecto Mejoramiento de la Carretera  
Santa María - Santa Teresa - Puente Hidroeléctrica Machu Picchu

DEPARTAMENTO:


CUSCO

PROVINCIA:

LA CONVENCIÓN Y  
URUBAMBA

DISTRITO:

MARANURA, SANTA TERESA Y  
MACHU PICCHU

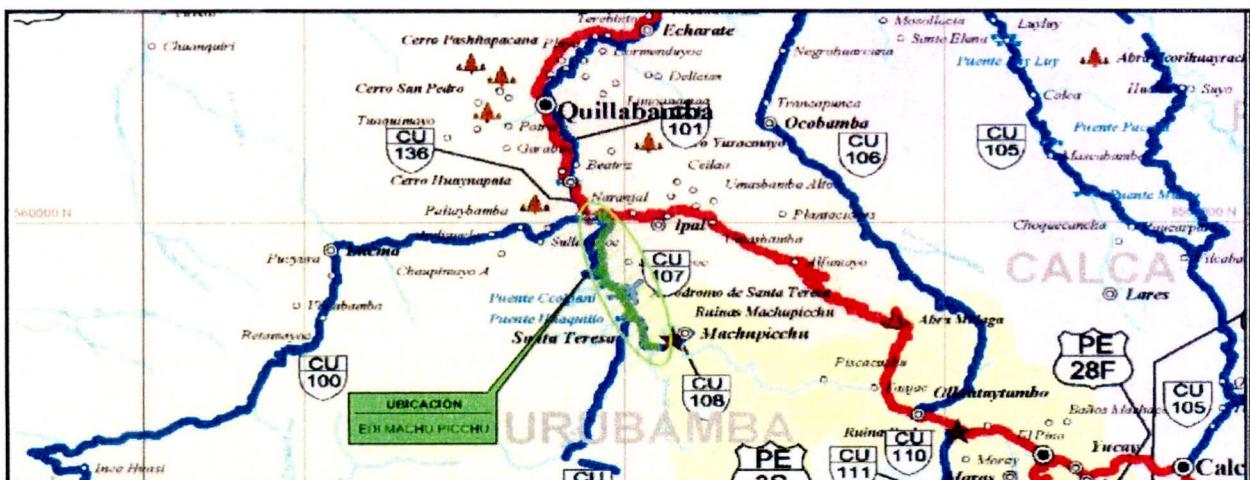

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

Ing. MIGUEL SALINAS SALINAS

FECHA:

ABRIL - 2020

EJEMPLAR:

ORIGINAL

VOLUMEN:

TOMO

I de I

VOLUMEN 10

Análisis de Precios Unitarios, Cronogramas y Presupuesto de Obra

**"ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA  
 CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE  
 HIDROELÉCTRICA MACHU PICCHU"  
 (0073-2016-MTC/20)**

---

**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y  
 PRESUPUESTO  
 (INFORME Nº03-INFORME FINAL)**

*Historial de versiones*

FECHA	CAUSAS
25.04.2019	Actualización del Presupuesto Informe Nº03
15.11.2019	Actualización del Presupuesto Informe Nº03
03.07.2020	Actualización del Presupuesto Informe Nº03

Creado por:

Ing. Carina Patricia Farfán Jimenes

Revisado por

Ing. Armando González González

Lima 03 de julio de 2020



## Índice

<b>1 Consideraciones generales de costos .....</b>
<b>1.1 Introducción .....</b>
<b>1.2 Análisis de costos directos.....</b>
1.2.1 Mano de obra .....
1.2.2 Materiales.....
1.2.3 Equipo mecánico .....
1.2.4 Herramientas.....
1.2.5 Tópicos particulares .....
<b>1.3 Análisis de costos indirectos.....</b>
1.3.1 Costos Indirectos Fijos .....
1.3.2 Costos Indirectos Variables .....
1.3.3 Utilidad .....
<b>1.4 Metrados y Presupuesto .....</b>
<b>1.5 Cronogramas de obra .....</b>
<b>2 Bases para el cálculo de Precios Unitarios .....</b>
<b>2.1 Costo de mano de obra .....</b>
<b>2.2 Cálculo de distancias y fletes .....</b>
<b>2.3 Costo de materiales.....</b>
<b>2.4 Costo de equipos mecánicos .....</b>
<b>2.5 Cálculo de distancias medias de transporte .....</b>
<b>2.6 Cálculo de rendimientos de transporte y de plantas .....</b>
<b>3 Análisis de Costos Directos .....</b>
<b>3.1 Movilización y Desmovilización de Equipos.....</b>
<b>3.2 Mantenimiento de tránsito temporal y seguridad vial .....</b>
<b>3.3 Análisis de Precios Unitarios de Partidas .....</b>
<b>3.4 Análisis de Precios Unitarios de Sub-Partidas .....</b>
<b>4 Análisis del Costo Indirecto .....</b>
<b>4.1 Análisis de Gastos Generales.....</b>
<b>5 Relación de precios y cantidades de recursos requeridos.....</b>
<b>6 Presupuesto de Obra .....</b>
<b>7 Relación de equipo mecánico mínimo .....</b>
<b>8 Fórmula Polinómica.....</b>

"Estudio Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Santa María - Santa Teresa - Puente Hidroeléctrica Machu Picchu"  
(0073-2016-MTC/20)

Análisis de Precios Unitarios y  
Presupuesto (Informe N°03-Informe  
Final)





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y ComunicacionesViceministerio  
de TransportesPROVIAS  
NACIONAL

- 9 Programación de Obra.....
- 10 Cronograma Valorizado y desembolso .....
- 11 Cronograma de adquisición de materiales.....
- 12 Cronograma de utilización de equipos.....

